



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
САХАЛИНСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

Отчетная презентация проекта повышения эффективности

---

## **Оптимизация процесса учета работы наемной техники**

**ДОКЛАДЧИК:**

**Римша Алексей Алексеевич**

Директор

**ОРГАНИЗАЦИЯ:**

МКП "ЗСМ им. М.аА.Федотова"



## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

### Заказчики процесса:

Директор, дорожные мастера, диспетчерская служба, бухгалтерия

### Периметр проекта:

Диспетчерская служба, производственные участки, бухгалтерия

### Владелец процесса:

Поносов Григорий Игоревич

Начальник технического отдела

### Руководитель проекта:

Поносов Григорий Игоревич

Начальник технического отдела

### Команда проекта:

Август Инесса Александровна; Благодарный Анатолий Николаевич; Варфоломеев Андрей Николаевич; Медведев Александр Викторович;

## 2. Обоснование выбора

### Описание проблемы:

Процесс подписания справок работы наемной техники, их дальнейшего учета и формирования отчетности занимает длительное время.

### Ключевой риск:

Риск двойной оплаты, потери документов, ошибок при ручном заполнении документов и отчетов.

## 3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Время формирования документов по учету работы наемной техники, часы	128.5	49.5
Количество ошибок, допущенных в процессе формирования документов по учету наемной техники	3	0

## 4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	10.01.2022	
1. Диагностика и целевое состояние	10.01.2022	07.02.2022
1.1. Разработка текущей карты процесса	10.01.2022	19.01.2022
1.2. Сбор фактических данных	10.01.2022	21.01.2022
1.3. Разработка целевой карты процесса	24.01.2022	07.02.2022
1.4. Разработка плана мероприятий	24.01.2022	07.02.2022
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	08.02.2022	10.03.2022
2.1. Сопровождение по защите подходов внедрения	08.02.2022	08.02.2022
2.2. Внедрение мероприятий	09.02.2022	10.03.2022
3. Анализ результатов и закрытие проекта	11.03.2022	18.04.2022
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	11.03.2022	09.04.2022
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	10.04.2022	10.04.2022
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	11.04.2022	15.04.2022
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	16.04.2022	18.04.2022

Руководитель ОИВ / ОМСУ

Руководитель проекта




Руководитель проектного офиса





# КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

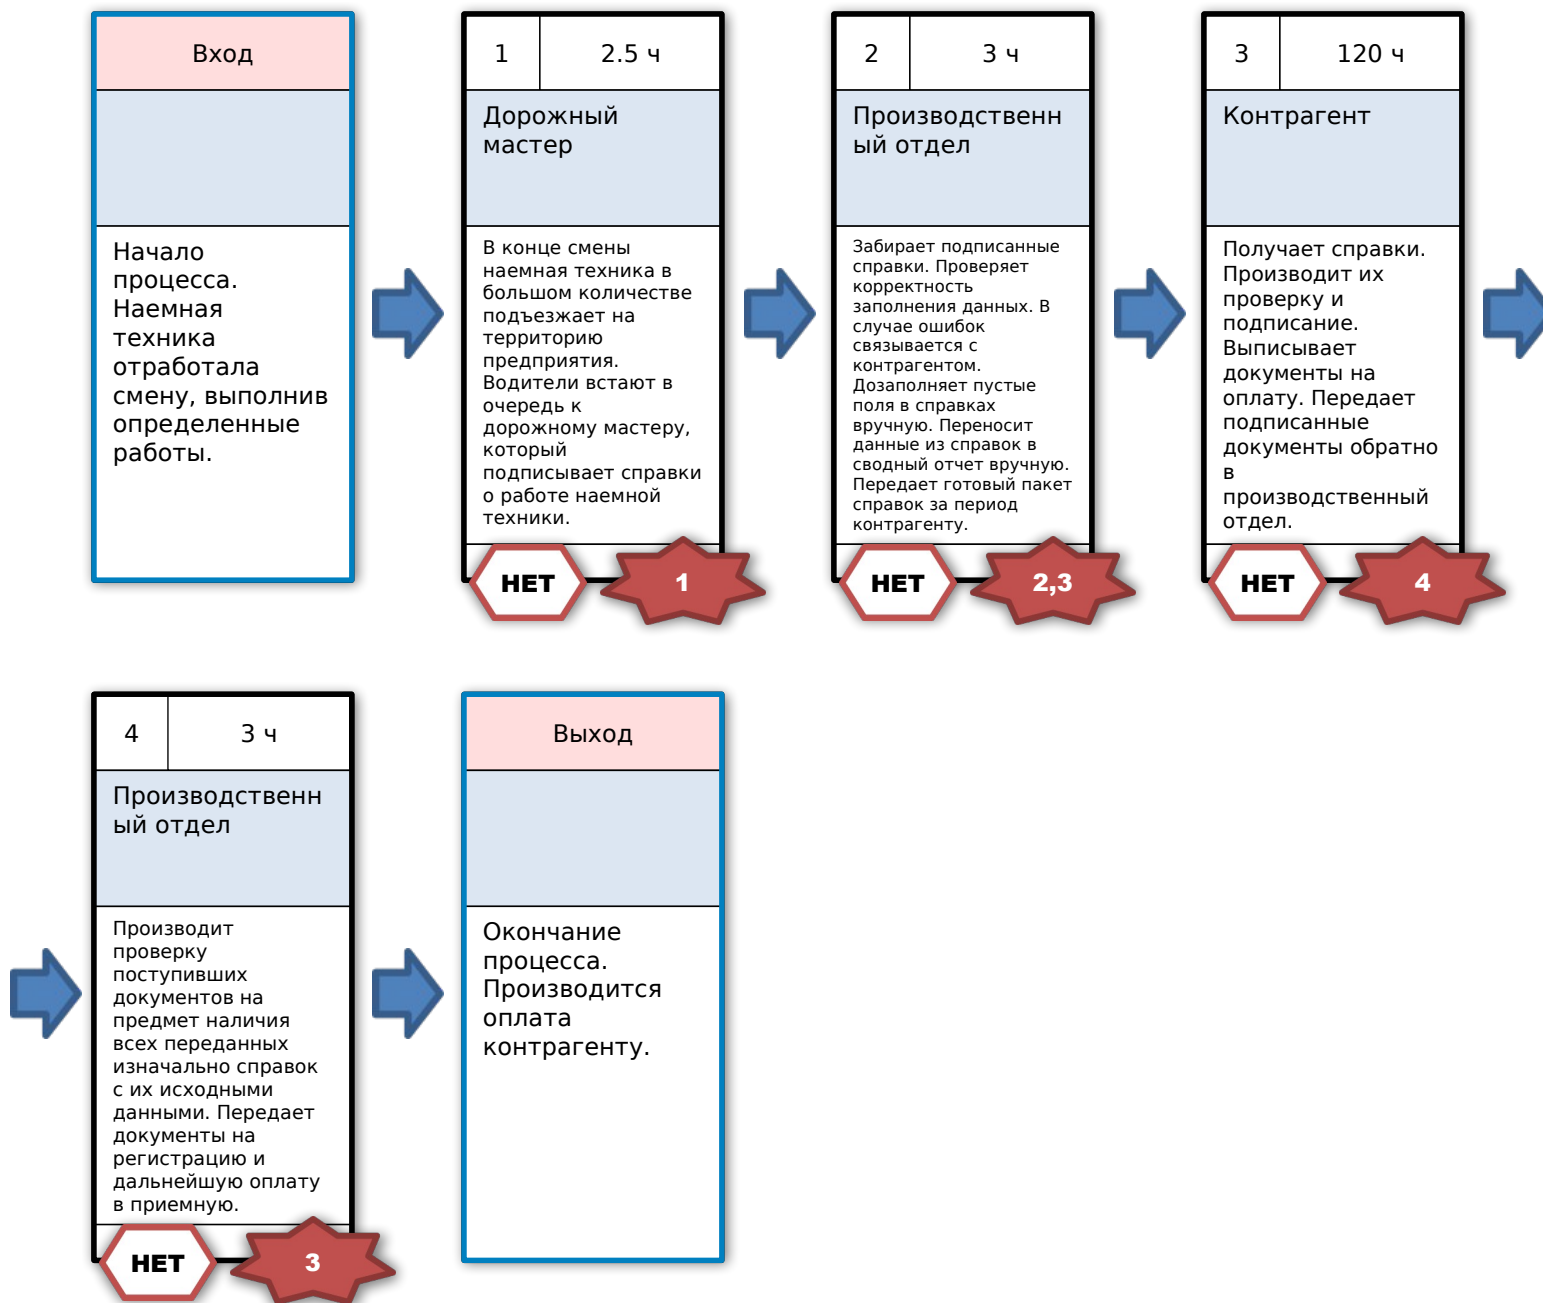

**Время протекания процесса:**  
**128.5 ч**

**Проблемы:**


1. Подписание справок дорожным мастером в конце смены занимает много времени, выходящего за его основное рабочее время. Длинные очереди из машин контрагентов и их водителей замедляют процессы, начинающиеся в уже следующую рабочую смену.
2. Ручное дозаполнение справок, перенос информации в свод/отчет занимает большое количество времени.
3. Излишний контроль и проверка документов отделом, не связанным напрямую с работой наемной техники
4. Задвоение или отсутствие справок работы наемной техники

**Легенда:**





# СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА

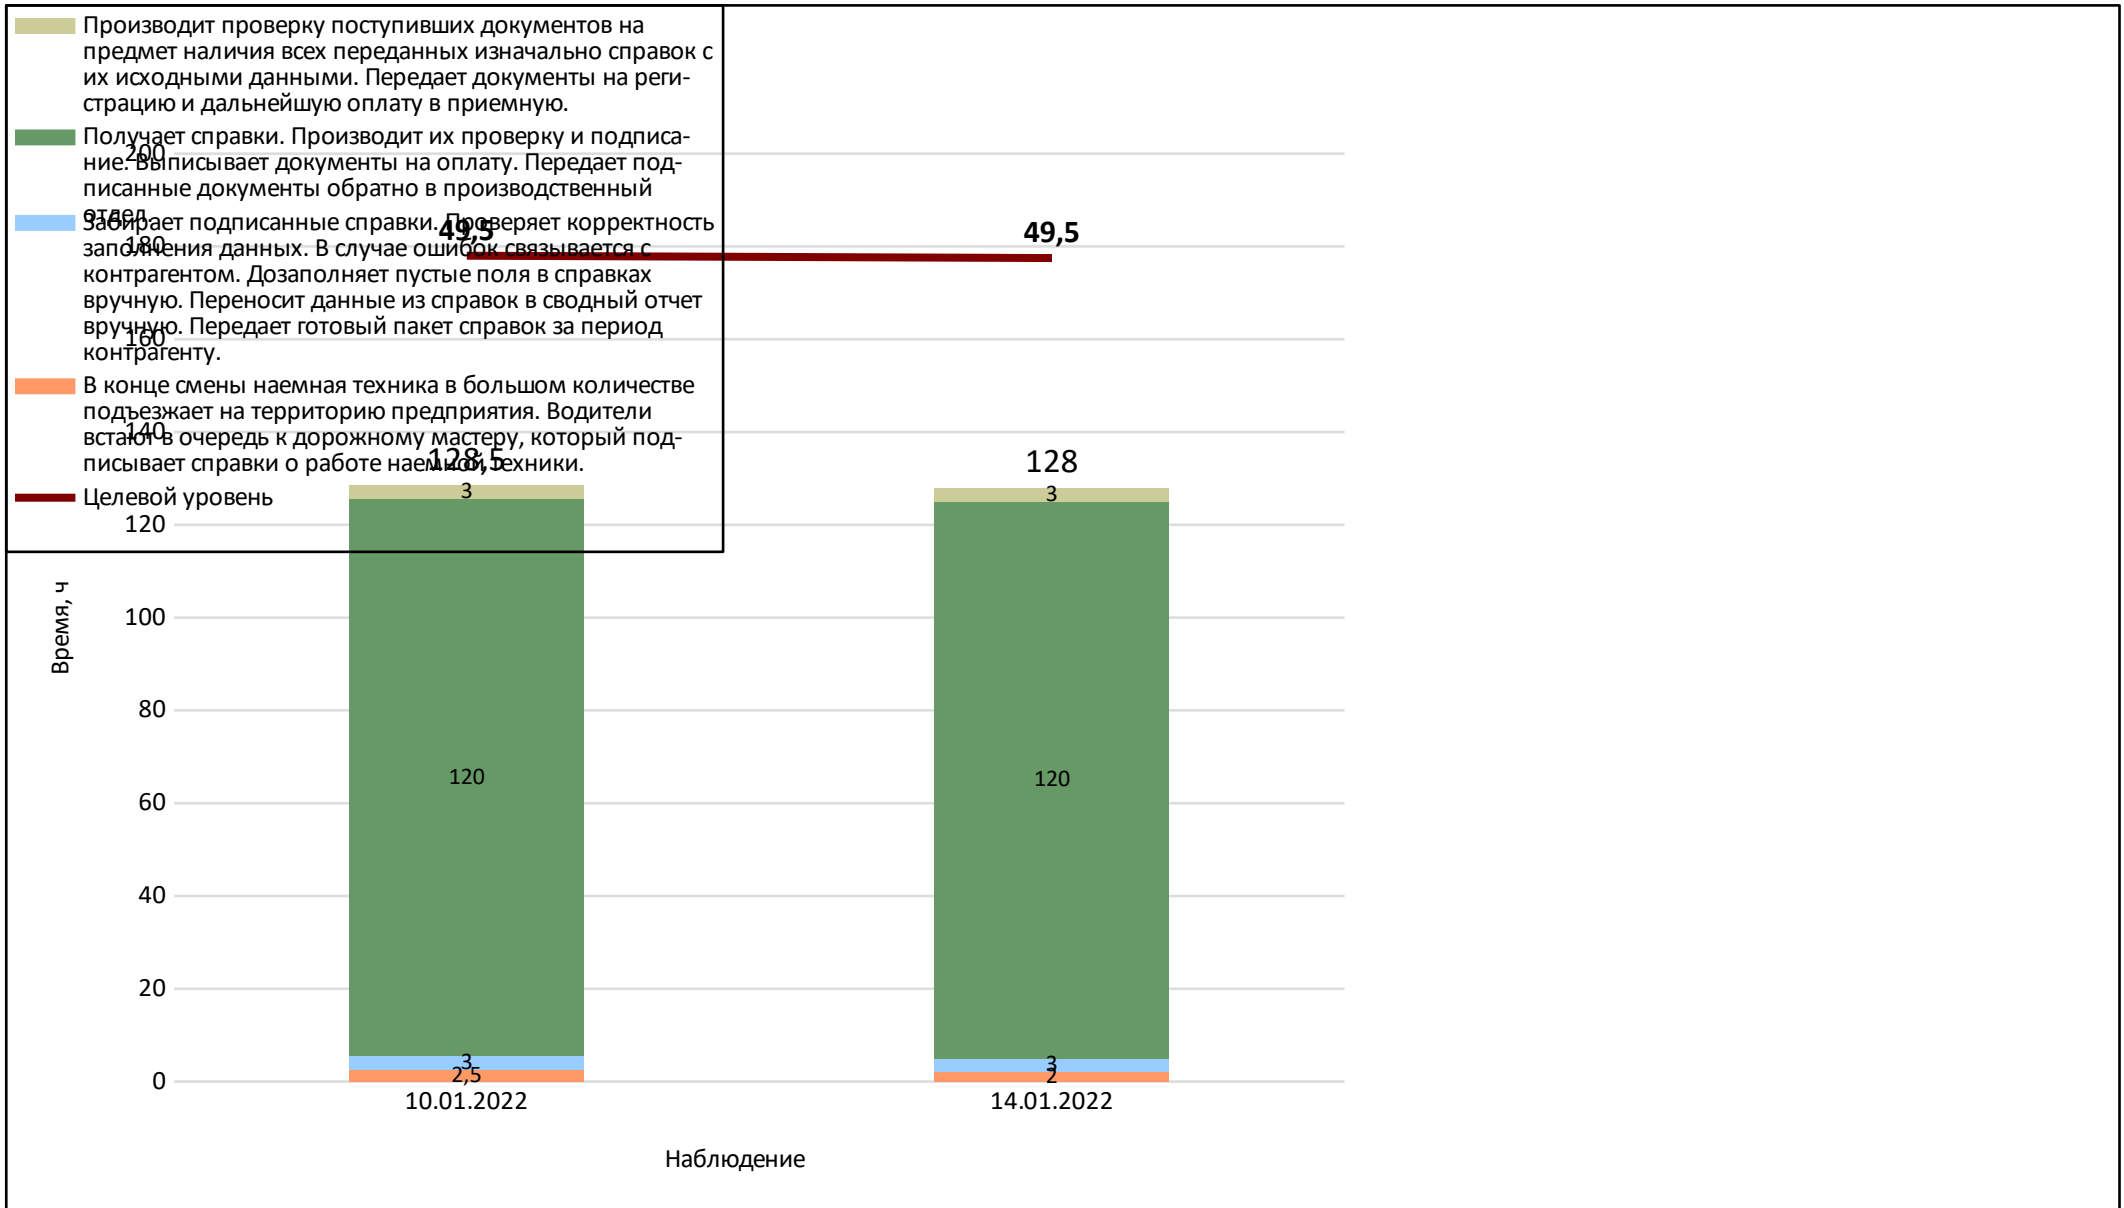




n/n	Проблема	Причина	Решение
1	Подписание справок дорожным мастером в конце смены занимает много времени, выходящего за его основное рабочее время. Длинные очереди из машин контрагентов и их водителей замедляют процессы, начинающиеся в уже следующую рабочую смену.	Ручное подписание справок, устаревший подход к работе с контрагентами	Пересмотреть текущий порядок работы с контрагентами. Перенести текущий производственный процесс на базу 1С. Формировать справки самостоятельно и автоматизировано с помощью программы 1С, что позволит не приезжать машинам контрагентов на территорию предприятия, не создавая большие очереди.
2	Ручное дозаполнение справок, перенос информации в свод/отчет занимает большое количество времени.	Отсутствие вспомогательных автоматизированных систем, позволяющих вести комплексный учет.	Разработать на базе 1С функционал, позволяющий вести первичный учет всей необходимой информации и позволяющий автоматически выводить необходимую отчетную информацию.
3	Излишний контроль и проверка документов отделом, не связанным напрямую с работой наемной техники	Исторически сложившийся и не пересматриваемый порядок работы	Передать контроль и ответственность за формирование и проверку документов диспетчерской службе, занимающейся изначально работой с контрагентами и наемной техникой.
4	Задвоение или отсутствие справок работы наемной техники	Человеческие умышленные и случайные факторы. Отсутствие автоматизированного вспомогательного контроля.	Разработать на базе 1С функционал, позволяющий осуществлять дополнительный автоматизированный контроль возвращаемых от контрагента документов.



# КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

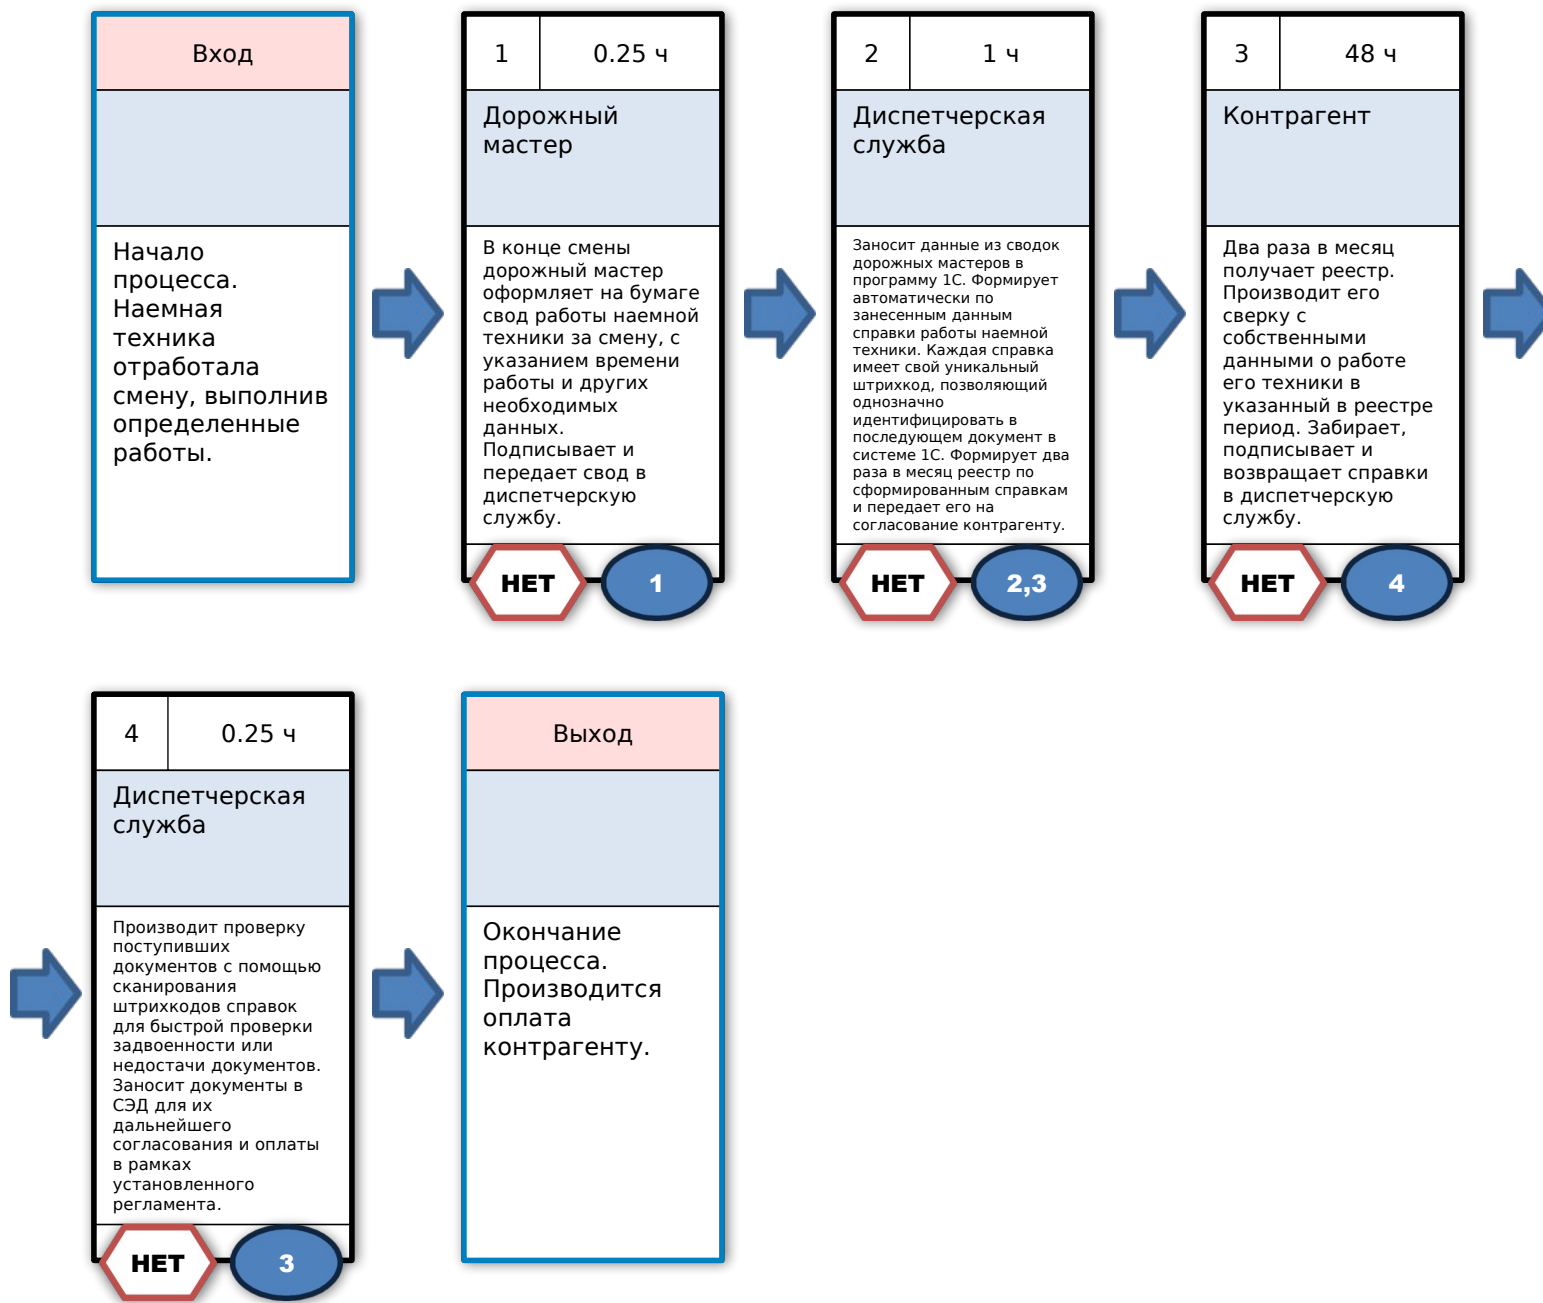

**Время протекания процесса:**

**49.5 ч**

**Предлагаемые решения:**

1. Пересмотреть текущий порядок работы с контрагентами. Перенести текущий производственный процесс на базу 1С. Формировать справки самостоятельно и автоматизировано с помощью программы 1С, что позволит не приезжать машинам контрагентов на территорию предприятия, не создавая большие очереди.

2. Разработать на базе 1С функционал, позволяющий вести первичный учет всей необходимой информации и позволяющий автоматически выводить необходимую отчетную информацию.

3. Передать контроль и ответственность за формирование и проверку документов диспетчерской службе, занимающейся изначально работой с контрагентами и наемной техникой.

4. Разработать на базе 1С функционал, позволяющий осуществлять дополнительный автоматизированный контроль возвращаемых от контрагента документов.

**Легенда:**





пп	Задача, Ответственный	План	Факт	Замечания	Статус
1	Пересмотреть текущий порядок работы с контрагентами. Перенести текущий производственный процесс на базу 1С. Формировать справки самостоятельно и автоматизировано с помощью программы 1С, что позволит не приезжать машинам контрагентов на территорию предприятия, не создавая большие очереди.  (Ответственный: Благодарный Анатолий Николаевич)	20.02.2022	09.02.2022		
2	Разработать на базе 1С функционал, позволяющий вести первичный учет всей необходимой информации и позволяющий автоматически выводить необходимую отчетную информацию.  (Ответственный: Варфоломеев Андрей Николаевич)	20.02.2022	09.02.2022		
3	Передать контроль и ответственность за формирование и проверку документов диспетчерской службе, занимающейся изначально работой с контрагентами и наемной техникой.  (Ответственный: Благодарный Анатолий Николаевич)	20.02.2022	09.02.2022		
4	Разработать на базе 1С функционал, позволяющий осуществлять дополнительный автоматизированный контроль возвращаемых от контрагента документов.  (Ответственный: Варфоломеев Андрей Николаевич)	20.02.2022	09.02.2022		




# МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Производит проверку поступивших документов с помощью сканирования штрихкодов справок для быстрой проверки задвоенности или недостачи документов. Заносит документы в СЭД для их дальнейшего согласования и оплаты в рамках установленного регламента. Заносит данные в сводов дорожных мастеров в программу 1С. Формирует автоматически по занесенным данным справки работы наемной техники. Каждая справка имеет свой уникальный штрихкод, позволяющий однозначно идентифицировать в последующем документ в системе 1С. Формирует два раза в месяц реестр по сформированным справкам и передает его на согласование контрагенту.

Два раза в месяц получает реестр. Производит его сверку с собственными данными о работе его техники в указанный в реестре период. Забирает, подписывает и возвращает справки в диспетчерскую службу.

В конце смены дорожный мастер оформляет на бумаге свод работы наемной техники за смену, с указанием времени работы и других необходимых данных. Подписывает и передает свод в диспетчерскую службу.


Целевой уровень

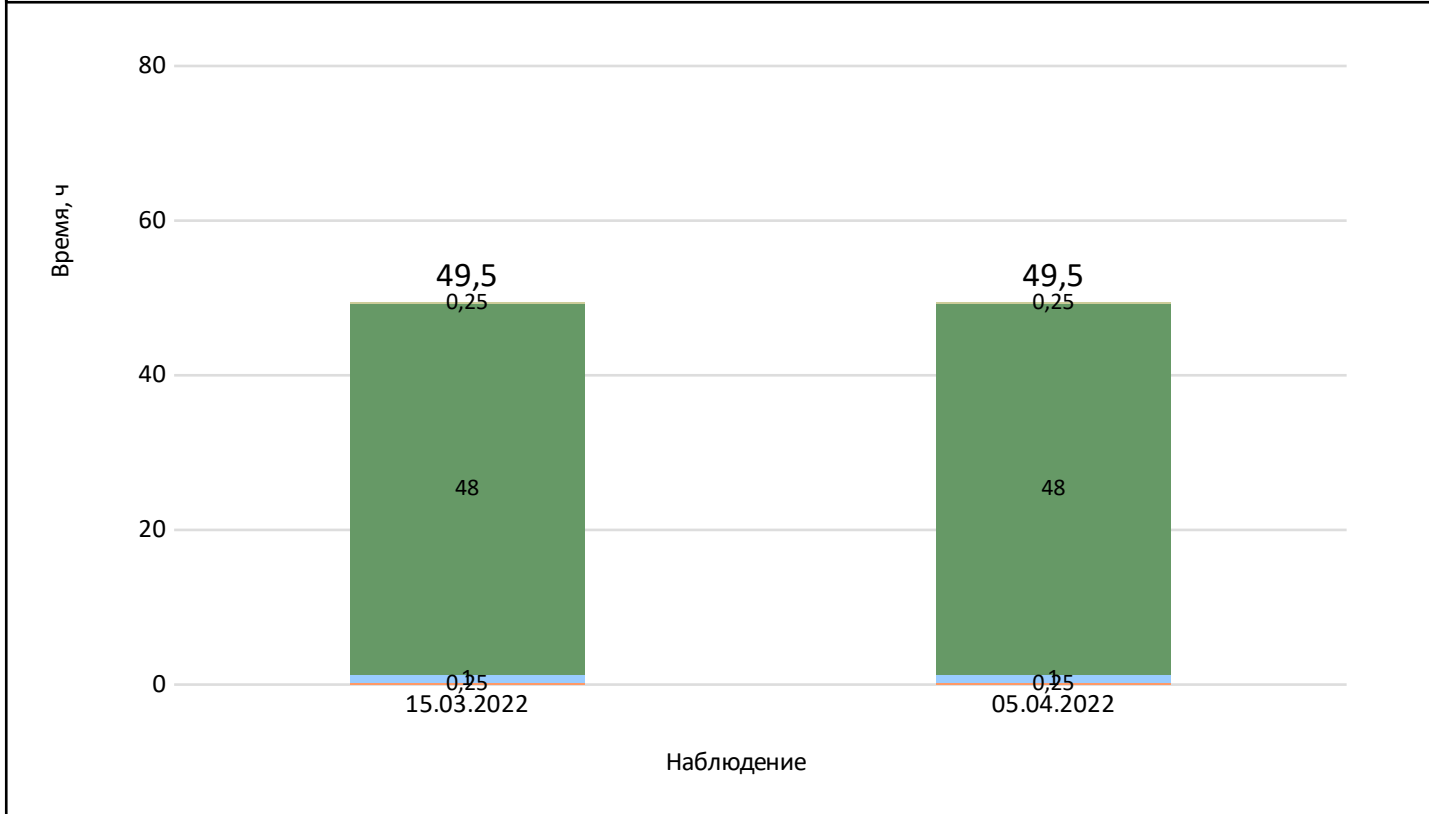





# КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

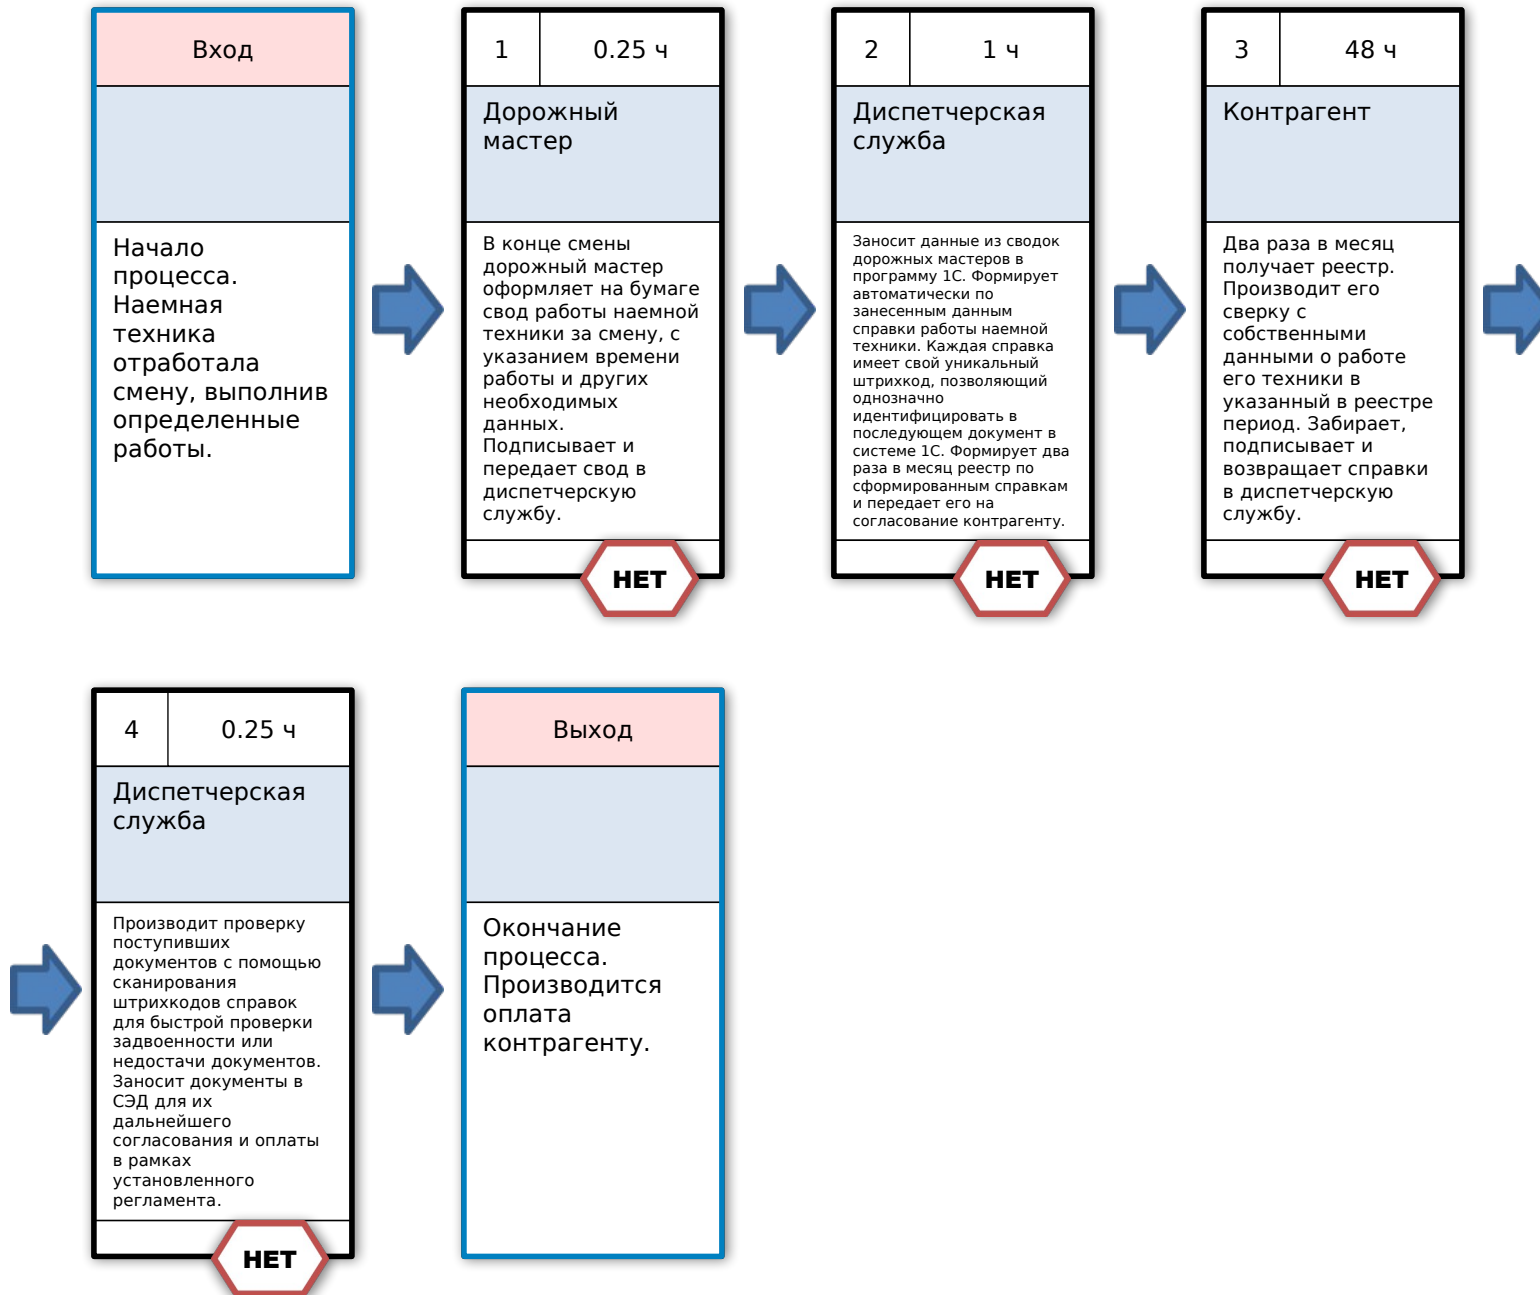

Время протекания процесса:  
**49.5 ч**

Решения:

Легенда:





пп	Показатель	База	Цель	Факт	Комментарий
1	Время формирования документов по учету работы наемной техники, часы	128.5	49.5	49,5	
2	Количество ошибок, допущенных в процессе формирования документов по учету наемной техники	3	0	0	

**Решение:**

Закреть проект

**Комментарии к решению:**



# ПРИЛОЖЕНИЯ



# ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА

---

## ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА

---

**Поносов Григорий Игоревич**  
Начальник технического отдела

## РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

---

**Поносов Григорий Игоревич**  
Начальник технического отдела

## КОМАНДА ПРОЕКТА

---

**Август Инесса  
Александровна**  
Главный бухгалтер

**Благодарный Анатолий  
Николаевич**  
Главный диспетчер

**Варфоломеев Андрей  
Николаевич**  
Инженер-электроник

**Медведев Александр  
Викторович**  
Заместитель директора

## Карта текущего состояния процесса

Участник процесса			
Наемная техника	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Выполнение работ</div>		
Дорожный мастер	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Подписание справок работы наемной техники</div>	2,5 часа	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Долгое подписание справок вручную, создающее длинные очереди</div>
Производственный отдел	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Проверка справок. Перенос данных в отчет. Передача документов контрагенту</div>	3 часа	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Ручное дозачисление справок, долгий перенос информации в отчет</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto; margin-top: 10px;">Излишний контроль и проверка документов</div>
Контрагент	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Проверка справок. Формирование документов на оплату. Передача документов ПО</div>	120 часов	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Зачисление или отсутствие справок работы наемной техники</div>
Производственный отдел	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Проверка документов. Передача документов на оплату</div>	3 часа	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Излишний контроль и проверка документов</div>
Бухгалтерия	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Оплата контрагенту</div>		
Общее время протекания процесса	Время протекания процесса = 128,5 часов		

## Карта целевого состояния процесса

Участник процесса	
Наемная техника	Выполнение работ
Дорожный мастер	Составление сводки работы наемной техники 0,25 часа Изменение порядка работы с контрагентами. Внедрение и перенос работы в программу 1С
Диспетчерская служба	Перенос данных из сводок в программу 1С. Формирование справок и реестра работ техники 1 час Разработать на базе 1С функционал, позволяющий вести учет информации о работе наемной техники. Передать контроль и ответственность за формирование и проверку документов диспетчерской службе
Контрагент	Проверка реестров. Сверка данных. Забор, подписание и возврат справок и документов на оплату 48 часов Разработать в 1С функционал, позволяющий осуществлять автоматизированный контроль возвращаемых от контрагента документов.
Диспетчерская служба	Проверка документов сканером штрихкодов. Занесение документов в СЭД для последующей оплаты 0,25 часа Передать контроль и ответственность за формирование и проверку документов диспетчерской службе
Бухгалтерия	Оплата контрагенту
Общее время протекания процесса	<b>Время протекания процесса = 49,5 часов</b>



# ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ

n/n	Наименование мероприятия	Эффект от мероприятия
1	Пересмотреть текущий порядок работы с контрагентами. Перенести текущий производственный процесс на базу 1С. Формировать справки самостоятельно и автоматизировано с помощью программы 1С, что позволит не приезжать машинам контрагентов на территорию предприятия, не создавая большие очереди.	Сокращение времени протекания процесса. Автоматизация процессов.
2	Разработать на базе 1С функционал, позволяющий вести первичный учет всей необходимой информации и позволяющий автоматически выводить необходимую отчетную информацию.	Сокращение времени протекания процесса. Автоматизация процессов.
3	Передать контроль и ответственность за формирование и проверку документов диспетчерской службе, занимающейся изначально работой с контрагентами и наемной техникой.	Разгрузка производственного отдела. Централизация ответственности за работу со справками в службе, изначально работающей с наемной техникой. Сокращение времени протекания процессов.
4	Разработать на базе 1С функционал, позволяющий осуществлять дополнительный автоматизированный контроль возвращаемых от контрагента документов.	Сокращение времени протекания процесса. Наличие уникального штрихкода на каждой справке позволило убрать возможные ошибки в задвоении или потери справок работы наемной техники при передачи документов между предприятием и контрагентом.



## Наименование мероприятия:

Пересмотреть текущий порядок работы с контрагентами. Перенести текущий производственный процесс на базу 1С. Формировать справки самостоятельно и автоматизировано с помощью программы 1С, что позволит не приезжать машинам контрагентов на территорию предприятия, не создавая большие очереди.

## Эффект от мероприятия:

Сокращение времени протекания процесса. Автоматизация процессов.

**СТАЛО:**

The screenshot displays the 'Справки работы наемной техники' (Equipment Work Orders) form in the 1C software. The interface includes a top navigation bar with icons for 'Главное', 'НСИ', 'Учет', 'Администрирование', 'Работа с оборудованием', and 'Подключаемое оборудование'. Below the navigation bar, there are search and filter options, including a search box and a 'Ссылка' (Link) field. The main area contains a table with the following columns: 'Номер' (Number), 'Дата' (Date), 'Смена' (Shift), 'База' (Base), 'Наименование техники' (Equipment Name), 'Вид машины по машине' (Machine Type), 'Вид машины по спр...' (Machine Type by Sp...), 'Гос. №' (State No.), 'Контрагент' (Contractor), 'Договор' (Contract), '№ договора' (Contract No.), and 'Счет' (Account). The table lists various work orders for excavators and vacuum cleaners, with the entry for '000010120' highlighted in yellow.

Номер	Дата	Смена	База	Наименование техники	Вид машины по машине	Вид машины по спр...	Гос. №	Контрагент	Договор	№ договора	Счет
000010102	18.05.2022 12:00:00	Дневная	База №1	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	8088 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010103	18.05.2022 12:00:01	Дневная	База №2	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	9988 СМ	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010104	18.05.2022 12:00:02	Дневная	База №1	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	7171 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010105	19.05.2022 12:00:00	Дневная	База №2	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	3268 СМ	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010106	19.05.2022 12:00:01	Дневная	База №1	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	7171 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010107	19.05.2022 12:00:02	Дневная	База №2	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	8088 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010108	19.05.2022 12:00:02	Дневная	База №2	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	9988 СМ	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010109	20.05.2022 12:00:00	Дневная	База №1	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	8088 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010110	23.05.2022 12:00:00	Дневная	База №2	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	7171 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010111	23.05.2022 12:00:01	Дневная	База №1	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	9988 СМ	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010112	24.05.2022 12:00:00	Дневная	База №2	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	7171 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010113	24.05.2022 12:00:01	Дневная	База №1	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	8088 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010114	24.05.2022 12:00:02	Дневная	База №2	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	9988 СМ	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010116	24.05.2022 12:00:03	Дневная	База №1	Эвакуатор	Эвакуатор, от 220 кВт	Эвакуатор, от 220 кВт	654 М ОХ	ИП Кириллов П.В.	Договор на услуги сп...	01/22 УТ	Б/Н
000010115	25.05.2022 12:00:00	Дневная	База №1	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	8088 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010117	25.05.2022 12:00:01	Дневная	База №1	Эвакуатор	Эвакуатор, от 220 кВт	Эвакуатор, от 220 кВт	654 М ОХ	ИП Кириллов П.В.	Договор на услуги сп...	01/22 УТ	Б/Н
000010126	27.05.2022 12:00:00	Дневная	База №1	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	9988 СМ	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010123	30.05.2022 12:00:00	Дневная	База №1	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	9988 СМ	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010124	30.05.2022 12:00:01	Дневная	База №2	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	7171 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010125	30.05.2022 12:00:02	Дневная	База №1	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	8088 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010119	31.05.2022 12:00:00	Дневная	База №1	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	7171 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010120	31.05.2022 12:00:01	Дневная	База №2	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	8088 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010121	31.05.2022 12:00:02	Дневная	База №2	Экскаватор	Экскаватор на пневмоходу, от 40 кВт	Экскаватор на пнев...	7567 СО	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н
000010122	31.05.2022 12:00:03	Дневная	База №1	Экскаватор	Экскаватор на пневмоколесном ход...	Экскаватор на пнев...	9988 СМ	ИП Но Сен Ир	Контракт на услуги сп...	120	Б/Н





## Наименование мероприятия:

Разработать на базе 1С функционал, позволяющий вести первичный учет всей необходимой информации и позволяющий автоматически выводить необходимую отчетную информацию.

## Эффект от мероприятия:

Сокращение времени протекания процесса. Автоматизация процессов.

**СТАЛО:**

Номер	Дополнение	Тип документа	Дата	Смена	Вид сводки	База	Производитель работ	Должность производителя работ
000003607		Сводки мастеров 1	18.05.2022 12:00:00	Дневная	Фактическая	База №1	Васиховский Сергей Ник...	Дорожный мастер
000003608		Сводки мастеров 1	18.05.2022 12:00:01	Дневная	Фактическая	База №2	Колосков Юрий Павлович	Дорожный мастер
000003609		Сводки мастеров 1	18.05.2022 12:00:02	Дневная	Фактическая	База №1	Речкин Максим Сергеевич	Мастер участка
000003610		Сводки мастеров 1	18.05.2022 12:00:03	Дневная	Фактическая	База №1	Измалкин Семен Алекса...	Дорожный мастер
000003611		Сводки мастеров 1	19.05.2022 12:00:00	Дневная	Фактическая	База №2	Колосков Юрий Павлович	Дорожный мастер
000003612		Сводки мастеров 1	19.05.2022 12:00:01	Дневная	Фактическая	База №1	Измалкин Семен Алекса...	Дорожный мастер
000003613		Сводки мастеров 1	19.05.2022 12:00:02	Дневная	Фактическая	База №2	Сергеев Сергей Эдуардо...	Мастер участка
000003614		Сводки мастеров 1	20.05.2022 12:00:00	Дневная	Фактическая	База №1	Речкин Максим Сергеевич	Мастер участка
000003615		Сводки мастеров 1	23.05.2022 12:00:00	Дневная	Фактическая	База №2	Сергеев Сергей Эдуардо...	Мастер участка
000003616		Сводки мастеров 1	23.05.2022 12:00:01	Дневная	Фактическая	База №1	Речкин Максим Сергеевич	Мастер участка
000003617		Сводки мастеров 1	24.05.2022 12:00:00	Дневная	Фактическая	База №2	Сергеев Сергей Эдуардо...	Мастер участка
000003618		Сводки мастеров 1	24.05.2022 12:00:01	Дневная	Фактическая	База №1	Речкин Максим Сергеевич	Мастер участка
000003619		Сводки мастеров 1	24.05.2022 12:00:02	Дневная	Фактическая	База №2	Колосков Юрий Павлович	Дорожный мастер
000003621		Сводки мастеров 1	24.05.2022 12:00:03	Дневная	Фактическая	База №1	Дояр Алексей Сергеевич	Мастер участка
000003620		Сводки мастеров 1	25.05.2022 12:00:00	Дневная	Фактическая	База №1	Речкин Максим Сергеевич	Мастер участка
000003622		Сводки мастеров 1	25.05.2022 12:00:01	Дневная	Фактическая	База №1	Измалкин Семен Алекса...	Дорожный мастер
000003633		Сводки мастеров 1	27.05.2022 12:00:00	Дневная	Фактическая	База №1	Жильцов Юрий Николаев...	Мастер участка
000003630		Сводки мастеров 1	30.05.2022 12:00:00	Дневная	Фактическая	База №1	Дояр Алексей Сергеевич	Мастер участка
000003631		Сводки мастеров 1	30.05.2022 12:00:01	Дневная	Фактическая	База №2	Сергеев Сергей Эдуардо...	Мастер участка
000003632		Сводки мастеров 1	30.05.2022 12:00:02	Дневная	Фактическая	База №1	Жильцов Юрий Николаев...	Мастер участка
000003626		Сводки мастеров 1	31.05.2022 12:00:00	Дневная	Фактическая	База №1	Жильцов Юрий Николаев...	Мастер участка
000003627		Сводки мастеров 1	31.05.2022 12:00:01	Дневная	Фактическая	База №2	Сергеев Сергей Эдуардо...	Мастер участка
000003628		Сводки мастеров 1	31.05.2022 12:00:02	Дневная	Фактическая	База №2	Колосков Юрий Павлович	Дорожный мастер
000003629		Сводки мастеров 1	31.05.2022 12:00:03	Дневная	Фактическая	База №1	Дояр Алексей Сергеевич	Мастер участка
000003623		Сводки мастеров 1	01.06.2022 14:51:19	Дневная	Планируемая	База №2	Колосков Александр Пав...	Дорожный мастер
000003624		Сводки мастеров 1	01.06.2022 15:06:11	Дневная	Планируемая	База №2	Колосков Александр Пав...	Дорожный мастер



Наименование мероприятия:

Передать контроль и ответственность за формирование и проверку документов диспетчерской службе, занимающейся изначально работой с контрагентами и наемной техникой.

Эффект от мероприятия:

Разгрузка производственного отдела. Централизация ответственности за работу со справками в службе, изначально работающей с наемной техникой. Сокращение времени протекания процессов.



## Наименование мероприятия:

Разработать на базе 1С функционал, позволяющий осуществлять дополнительный автоматизированный контроль возвращаемых от контрагента документов.

## Эффект от мероприятия:

Сокращение времени протекания процесса. Наличие уникального штрихкода на каждой справке позволило убрать возможные ошибки в задвоении или потери справок работы наемной техники при передачи документов между предприятием и контрагентом.

**СТАЛО:**

N	Проверка	Пометка удаления	Заказчик наемной те...	Справка	Наименова...	Номер	Дата работы	Смена	База	Вид машины п...	Вид машины п...	Контраге
1			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000008856 от 20.01.2022 12:00:07	Самосвал	В889СР	20.01.2022 12:00:07	Дневная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
2			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000008876 от 23.01.2022 12:00:16	Самосвал	В889СР	23.01.2022 12:00:16	Дневная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
3			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000008880 от 24.01.2022 12:00:14	Самосвал	В889СР	24.01.2022 12:00:14	Дневная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
4			Павлючик Сергей Ив...	Справки работы наемной техники 000008908 от 19.01.2022 12:00:05	Самосвал	В889СР	19.01.2022 12:00:05	Ночная	База №1	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
5			Павлючик Сергей Ив...	Справки работы наемной техники 000008909 от 19.01.2022 12:00:05	Самосвал	М697НК	19.01.2022 12:00:05	Ночная	База №1	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
6			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000008928 от 22.01.2022 12:00:10	Самосвал	В889СР	22.01.2022 12:00:10	Ночная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
7			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000008929 от 22.01.2022 12:00:10	Самосвал	М697НК	22.01.2022 12:00:10	Ночная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
8			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000008933 от 18.01.2022 12:00:05	Самосвал	М771ХВ	18.01.2022 12:00:05	Дневная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
9			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000008934 от 17.01.2022 12:00:15	самосвал	Н178БТ	17.01.2022 12:00:15	Дневная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
10			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000008935 от 17.01.2022 12:00:15	Самосвал	М771ХВ	17.01.2022 12:00:15	Дневная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
11			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000008936 от 23.01.2022 12:00:16	Самосвал	М697НК	23.01.2022 12:00:16	Дневная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
12			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000008937 от 22.01.2022 12:00:11	Самосвал	М697НК	22.01.2022 12:00:11	Дневная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
13			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000009105 от 16.01.2022 12:00:11	Самосвал	В889СР	16.01.2022 12:00:11	Ночная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
14			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000009106 от 16.01.2022 12:00:11	самосвал	К048РК	16.01.2022 12:00:11	Ночная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
15			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000009110 от 17.01.2022 12:00:10	Самосвал	В889СР	17.01.2022 12:00:10	Ночная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
16			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000009111 от 17.01.2022 12:00:10	самосвал	К048РК	17.01.2022 12:00:10	Ночная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
17			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000009112 от 19.01.2022 12:00:11	самосвал	К048РК	19.01.2022 12:00:11	Ночная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
18			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000009113 от 21.01.2022 12:00:06	Самосвал	М697НК	21.01.2022 12:00:06	Ночная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр
19			Благодарный Анатол...	Справки работы наемной техники 000009122 от 23.01.2022 12:00:02	Самосвал	М697НК	23.01.2022 12:00:02	Ночная	База №2	Самосвал от 2...	Самосвал от 2...	ООО "Гр



## КОНТРАКТ № на оказание услуг спецтехники

ИКЗ

г. Южно-Сахалинск

«» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Муниципальное казенное предприятие «Завод строительных материалов имени Героя Советского Союза М. А. Федотова» городского округа город Южно - Сахалинск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ) по результатам проведения электронного аукциона, на основании Протокола № от 13 сентября 2019 года заключили настоящий контракт о нижеследующем:

### Статья 1 Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги спецтехники (далее – Услуги) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Место оказания услуг: в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск» Сахалинской области.

1.3. Услуги предоставляются Заказчику в соответствии с Заявками Заказчика (Приложение № 5 к Контракту), в которых указывается количество и наименование необходимой спецтехники.

### Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определяется на основании результатов электронного аукциона и составляет. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3 Цена Контракта включает в себя стоимость услуг, все налоги и сборы, а также иные расходы

Спасибо за внимание.
